

ROYAUME DU MAROC  
—  
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR  
—  
PROVINCE FAHS-ANJRA  
—  
CONSEIL PROVINCIAL



المملكة المغربية  
—  
وزارة الداخلية  
—  
إقليم الفحص - أنجرة  
—  
المجلس الإقليمي

# التقرير السنوي لتقييم برنامج تنمية إقليم الفحص - أنجرة 2023-2028



شتنبر 2024

# عناصر التقرير



1. مكونات برنامج تنمية الإقليم
2. برنامج التنمية
3. مخطط العمل
4. تكلفة البرنامج
5. تقدم المشاريع
6. مؤشرات التأثير الإيجابي للمشاريع على الساكنة
7. الإكراهات وصعوبات التنفيذ

# برنامج تنمية إقليم الفحص-أنجرة 2023-2028

## تقديم

يأتي هذا التقرير تنفيذاً لمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.300 الصادر في 29 يونيو 2016، المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، التي تنص على قيام رئيس المجلس بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج تنمية الإقليم.

تأشيرة السيد العامل

27 نونبر 2023

مصادقة المجلس الإقليمي

الدورة الاستثنائية لشهر ماي 2023

## 1. مكونات برنامج تنمية الإقليم

يتألف برنامج تنمية الإقليم من أربعة أجزاء أساسية:

خصص لإبراز الإطار الدستوري والقانوني وأبعاد البرنامج، والمرتكزات والمراحل الأساسية لإعداده، وخطة التواصل وآليات التشخيص التشاركي المعتمدة.

الجزء الأول: السياق العام ومراحل إعداد برنامج التنمية

خصص للتعريف بالإقليم وبأجهزته ومميزاته ومؤهلاته، وتشخيص وضعه الإقليمي من حيث الإمكانيات والمؤشرات والمقومات والإكراهات، وعرض نتائج التشخيص التشاركي.

الجزء الثاني: التشخيص الترابي للإقليم / الحاجيات والإمكانيات

خصص لإبراز المشاريع المبرمجة أو المتوقعة بالإقليم من طرف الفاعلين العموميين، والأولويات، والمشاريع المعتمدة في برنامج تنمية الإقليم 2023-2028

الجزء الثالث: برنامج تنمية إقليم الفحص أنجرة

خصص لتقييم برنامج التنمية السابق للإقليم 2017-2022، وعرض وضعه وتطور مالية الإقليم، والتركيبية المالية للبرنامج.

الجزء الرابع: الهندسة المالية لبرنامج تنمية الإقليم ومنظومة التتبع

## II. برنامج التنمية

- استنادا على نتائج التشخيص التشاركي، وانسجاما مع مجال الاختصاصات الذاتية لمجالس العمالات والأقاليم، اعتمد المجلس الإقليمي برمجة تشمل أربعة أولويات تتضمن برامج ومشاريع متناسقة:



## III. مخطط العمل 2023-2028

- ضم مخطط عمل برنامج تنمية إقليم الفحص-أنجرة 2023-2028 **96مشروعاً**، بتكلفة تقديرية إجمالية وصلت إلى **228,24 مليون درهم**. وقد تم تقسيمها على الشكل التالي:

النسبة %	التكلفة التقديرية م د	النسبة %	العدد الإجمالي	مشاريع برنامج التنمية
57,41	131,02	70,83	68	المشاريع المدرجة خلال سنوات 2023-2024-2025
42,59	97,22	29,17	28	المشاريع المدرجة خلال سنوات 2026-2027-2028

## ٣.٣ مخطط العمل 2023-2028


وتتوزع هذه المشاريع حسب الأولويات خلال السنوات 2023-2028 على الشكل التالي:

الأولويات	عدد المشاريع 2028-2023	التكلفة التقديرية م د	نسبة التكلفة %	في طور الإنجاز	منتهي	متوقف أو ملغى	المشاريع المتبقية
النقل المدرسي	8	59.59	26	4	4	0	0
تقوية الطرق والمسالك والكهرباء	72	100.78	44	25	2	0	45
التقليص من مظاهر الفقر والهشاشة	4	36.50	16	0	0	0	4
التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والاجتماعية والرياضية	12	31.37	14	0	0	3	9
المجموع	96	228.24	100	29	6	3	58

## IV. تكلفة البرنامج 2023-2028

تقدر تكلفة برنامج تنمية الإقليم ب: 228.24 مليون درهم


توزيع تكلفة البرنامج حسب المساهمات المالية

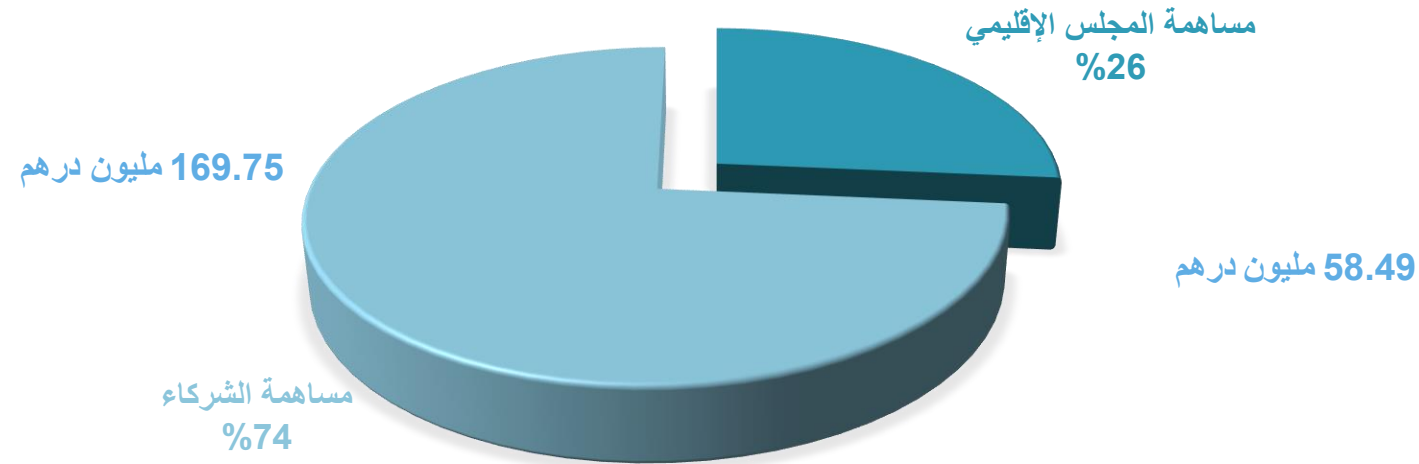



# IV. تكلفة البرنامج 2028-2023

## 2- توزيع تكلفة البرنامج حسب الأولويات والشركاء:

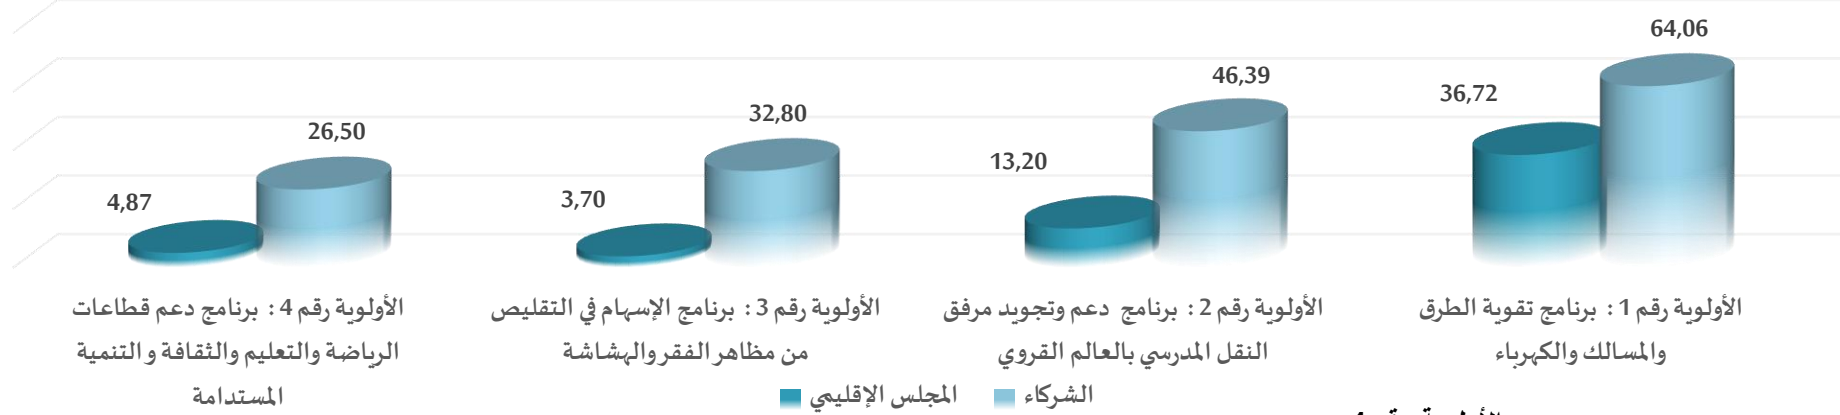

## IV. تكلفة البرنامج 2023-2028

### المساهمة المالية للمجلس الإقليمي في مشاريع البرنامج إلى حدود شتنبر 2024

النسبة %	مساهمة المجلس الفعلية م د	مساهمة المجلس التقديرية م د	المجالات
67	*4,40	6,60	النقل المدرسي
100	0,85	0,85	الكهربة القروية
100	14,09	14,09	المسالك القروية
90	19,34	21,54	المجموع

\*في انتظار التوصل باعتماد 2,2 م,د من وزارة الداخلية

## ٧. تقدم المشاريع

بفضل مجهودات جميع الفاعلين بالإقليم تم إنجاز العديد من المشاريع، كما تم توفير الاعتمادات المالية لمجموعة أخرى من المشاريع قصد تنفيذها.

وبتتبع مؤشرات الإنجاز نخلص إلى مجموعة من النتائج تم تصنيفها بحسب سنوات الإدراج في برنامج التنمية على الشكل التالي:

- المشاريع المدرجة في البرنامج خلال السنوات الثلاث الأولى 2023-2024-2025 المنفذة أو التي في طور التنفيذ.
- المشاريع المدرجة في برنامج التنمية خلال سنوات 2023 و2024 والتي تم تنفيذها أو في طور التنفيذ.


# ٧. تقدم المشاريع

2024-2023

1. مؤشرات الإنجاز حسب عدد المشاريع

النسبة %	مشاريع في طور الإنجاز أو منتهية إلى غاية شتنبر 2024	العدد الإجمالي	مشاريع برنامج التنمية
51,47	35	68	المشاريع المبرمجة خلال سنوات 2023-2024-2025
72,92		48	المشاريع المدرجة خلال سنوات 2024-2023

مؤشرات الإنجاز حسب عدد المشاريع المدرجة في السنتين 2024-2023

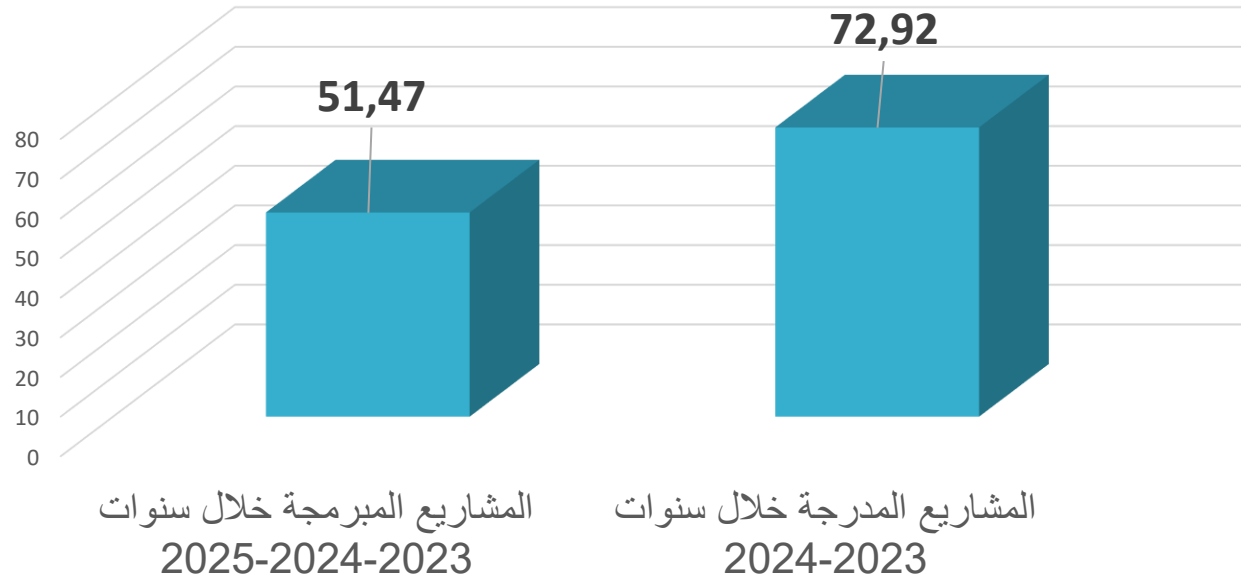

# ٧. تقدم المشاريع

2024-2023

المشاريع المتبقية	ملغى	منتهي	في طور الإنجاز	عدد المشاريع المبرمجة 2024-2023	الأولويات
0	-	4	4	8	النقل المدرسي
-	-	2	22	24	المسالك القروية
2	-	-	1	3	الكهربية القروية
3	-	-	-	3	التقليص من مظاهر الفقر والهشاشة
7	3	-	-	10	التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والاجتماعية والرياضية
12	3	6	27	48	المجموع


# ٧. تقدم المشاريع

## 2024-2023

### 2. مؤشرات الإنجاز حسب الكلفة التقديرية للمشاريع

النسبة %	الكلفة التقديرية الإجمالية للمشاريع في طور الإنجاز أو منتهية إلى غاية شتنبر 2024 م د	الكلفة التقديرية الإجمالية م د	مشاريع برنامج التنمية
40,37	52,89	131,02	المشاريع المبرمجة خلال سنوات 2023-2024-2025
65,38		80,90	المشاريع المدرجة خلال سنوات 2024-2023

### مؤشرات الإنجاز حسب الكلفة التقديرية للمشاريع المدرجة في السنتين 2024-2023

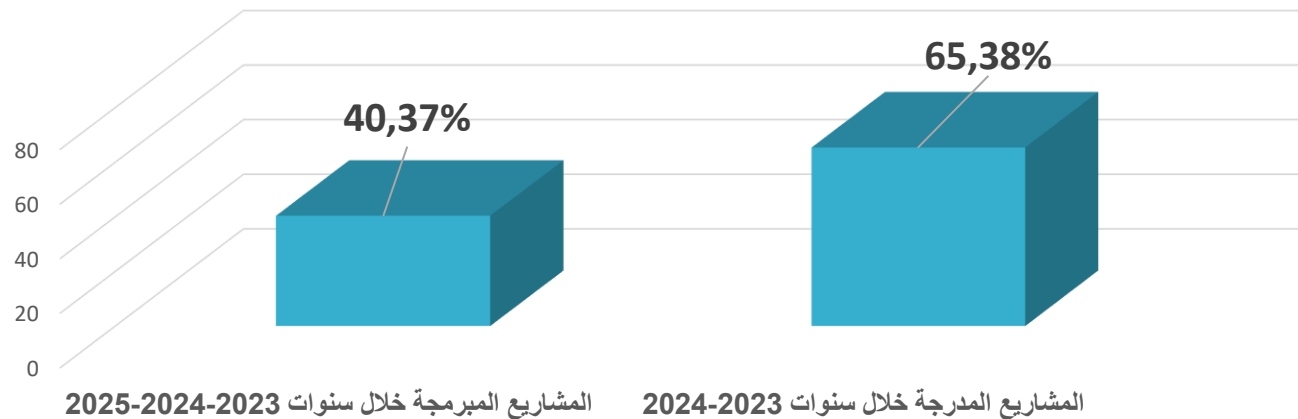

اسم المشروع	توطين المشروع	الكلفة الاجمالية بالدرهم	الشركاء	الكلفة والمساهمة المالية والتزامات الأطراف بالدرهم	وضعية التزام الاطراف	نسبة الانجاز
تأسيس شركة التنمية الإقليمية " النقل المدرسي الفحص- أنجرة"	إقليم الفحص أنجرة	6.300.000,00 درهم	المجلس الإقليمي	2.200.000,00	تم تنفيذ الالتزامات المالية لكافة أطراف الاتفاقية في الأجل المحددة.	100% تاريخ التأسيس: 04 يناير 2023 -بداية العمل الميداني: 01 فبراير 2023
			مجلس الجهة	2.000.000,00		
			جماعات الإقليم (7) السبع	2.100.000,00 ( عن كل جماعة : 300.000,00)		
المساهمة السنوية لفائدة شركة التنمية المحلية للنقل المدرسي الفحص أنجرة	إقليم الفحص أنجرة	11.000.000,00 درهم (2.200.000,00 درهم مساهمة سنوية على مدى خمس سنوات (2027-2023)	المجلس الإقليمي	استعمال حافلات النقل المدرسي لتنقلات التلاميذ من وإلى المؤسسات التعليمية وكذا الأنشطة الموازية	تم وضع رهن الشركة (13) حافلة	
				وضع حافلات النقل المدرسي المملوكة للمجلس رهن إشارة الشركة		
				تعبئة مساهمة مالية سنوية: 2.200.000,00 لفائدة الشركة	تم تحويل المساهمة المالية عن سنة 2023 بتاريخ 16/06/2023	20%

اسم المشروع	توطين المشروع	الكلفة الاجمالية بالدرهم	الشركاء	الكلفة والمساهمة المالية والتزامات الأطراف بالدرهم	وضعية التزام الاطراف	نسبة الانجاز
اقتناء (08) حافلات للنقل المدرسي	إقليم الفحص أنجرة	3.100.000,00	اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية	3.100.000,00 درهم المساهمة المالية تخصص حصريا لاقتناء 08 الحافلات للنقل المدرسي	تم تسليم مفاتيح حافلات النقل المدرسي لشركة التنمية الإقليمية النقل المدرسي للفحص أنجرة، يوم الخميس 25 ماي 2023 بمقر عمالة الفحص أنجرة.	100%
			المجلس الإقليمي	القيام بجميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموضوع		
دعم مالي من طرف مؤسسة طنجة المتوسط لفائدة المجلس الإقليمي لمدة 5 سنوات	إقليم الفحص أنجرة	8.500.000,00 (1.700.000,00 درهم مساهمة سنوية على مدى خمس سنوات (2027-2023)	مؤسسة طنجة المتوسط	. تعبئة منحة مالية سنوية: 1.700.000,00 درهم طيلة المدة التي تغطيها الاتفاقية أي ما مجموعه 8.500.000 درهم		20%
				** تم تحويل هذه المساهمة في حساب المجلس الإقليمي على دفعتين : • 850.000,00 درهم بتاريخ 30/05/2023 • 850.000,00 بدرهم بتاريخ 22/09/2023		
			المجلس الإقليمي	تحويل المنحة المالية المقدمة إليه لفائدة الشركة التنمية الإقليمية المكلفة بتدبير مرفق النقل المدرسي بالإقليم رفع تقرير سنوي الى الشركاء يتضمن بيان التكاليف والمصاريف وحصيلة تدبير مرفق النقل المدرسي	تم تحويل المساهمة السنوية المقدمة من مؤسسة طنجة المتوسط عن سنة 2023 في حساب الشركة على دفعتين • 850.000,00 بتاريخ 13/09/2023 • 850.000,00 بتاريخ 20/10/2023	



اسم المشروع	توطين المشروع	الكلفة الاجمالية بالدرهم	الشركاء	الكلفة والمساهمة المالية والتزامات الأطراف بالدرهم	وضعية التزام الاطراف	نسبة الانجاز
اقتناء 04 حافلات للنقل المدرسي من طرف شركة انتاج الطاقة الريحية ACWA POWER	إقليم الفحص أنجرة	1.590.000,00	شركة إنتاج الطاقة الريحية ACWA POWER KHALLADI	تساهم بحصة مالية قدرها 1.590.000 درهم برسم سنوات 2020-2021-2022: لاقتناء أربع (04) حافلات للنقل المدرسي.	تم اقتناء 04 حافلات وتسجيلها في ملكية شركة التنمية الإقليمية في يناير 2023	100%
			المجلس الإقليمي	وضع هذه الحافلات رهن إشارة الشركة المعهود إليها تدبير وتسيير مرفق النقل المدرسي		
			اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية	عملية الاشراف		
دعم مالي مقدم من طرف ACWA POWER KHALLADI شركة إنتاج الطاقة الريحية لمدة 05 سنوات	إقليم الفحص أنجرة	4.500.000,00 (مساهمة سنوية قدرها 900.000,00 درهم على خمس سنوات 2023-2027)	اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية	الإشراف وتنسيق أنشطة مختلف المتدخلين في إنجاز المشروع.	تم تحويل المساهمة السنوية المقدمة من قبل شركة إنتاج الطاقة الريحية لفائدة شركة التنمية الإقليمية المكلفة بتدبير النقل المدرسي بالإقليم بالنسبة لسنتي 2023 و 2024	40%
			شركة أنتاج الطاقة الريحية ACWA POWER KHALLADI	تخصيص منحة مالية سنوية قدرها 900.000 درهم طيلة المدة التي تغطيها الاتفاقية، أي ما مجموعه 4.500.000 درهم		
			المجلس الإقليمي	تحويل المنحة المالية المقدمة لفائدة شركة التنمية الإقليمية المكلفة بتدبير مرفق النقل المدرسي بالإقليم.		

اسم المشروع	توطين المشروع	الكلفة الاجمالية بالدرهم	الشركاء	الكلفة والمساهمة المالية والتزامات الأطراف بالدرهم	وضعية التزام الاطراف	نسبة الانجاز
اقتناء 02 حافلتين للنقل المدرسي من طرف شركة رونو المغرب	إقليم الفحص أنجرة	800.000,00	شركة التنمية الإقليمية "النقل المدرسي للفحص أنجرة"	تدبير مرفق النقل المدرسي	تم تسليم الحافلات بتاريخ 25/05/2023	100%
			مؤسسة رونو المغرب	منح 02 حافلتين للنقل المدرسي لفائدة الشركة التنمية الإقليمية للنقل المدرسي الفحص أنجرة		
				تعبئة منحة مالية قدرها 150.000,00 درهم برسم سنة 2023		
دعم مالي من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية لفائدة شركة التنمية الإقليمية "النقل المدرسي" لمدة 05 سنوات	إقليم الفحص أنجرة	3.300.000,00 (مساهمة سنوية قدرها 660.000,00 درهم على خمس سنوات (2027-2023)	المجلس الإقليمي	التوظيف الأمثل للدعم المالي وتخصيصه حصريا لتمويل العمليات والأنشطة المتعلقة بتسيير مرفق النقل المدرسي	لم يتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة	0%
			المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالفحص أنجرة	تخصيص منحة مالية سنوية قدرها 660 000 ,00 درهم على سبيل الدعم لفائدة شركة التنمية الإقليمية لتدبير النقل المدرسي بإقليم الفحص أنجرة وذلك طيلة المدة التي تغطيها الاتفاقية		


## المستفيدون

المسجلون في منصة النقل المدرسي  
الى غاية 30 شتنبر 2024


6209 إلى غاية نهاية شهر يونيو 2024  
6677 إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024

مقابل 5755 تلميذ(ة) في الموسم  
الدراسي 2022-2023: بزيادة قدرها  
11,6%

و6209 تلميذ(ة) في الموسم الدراسي  
2023-2024: بزيادة قدرها 10%

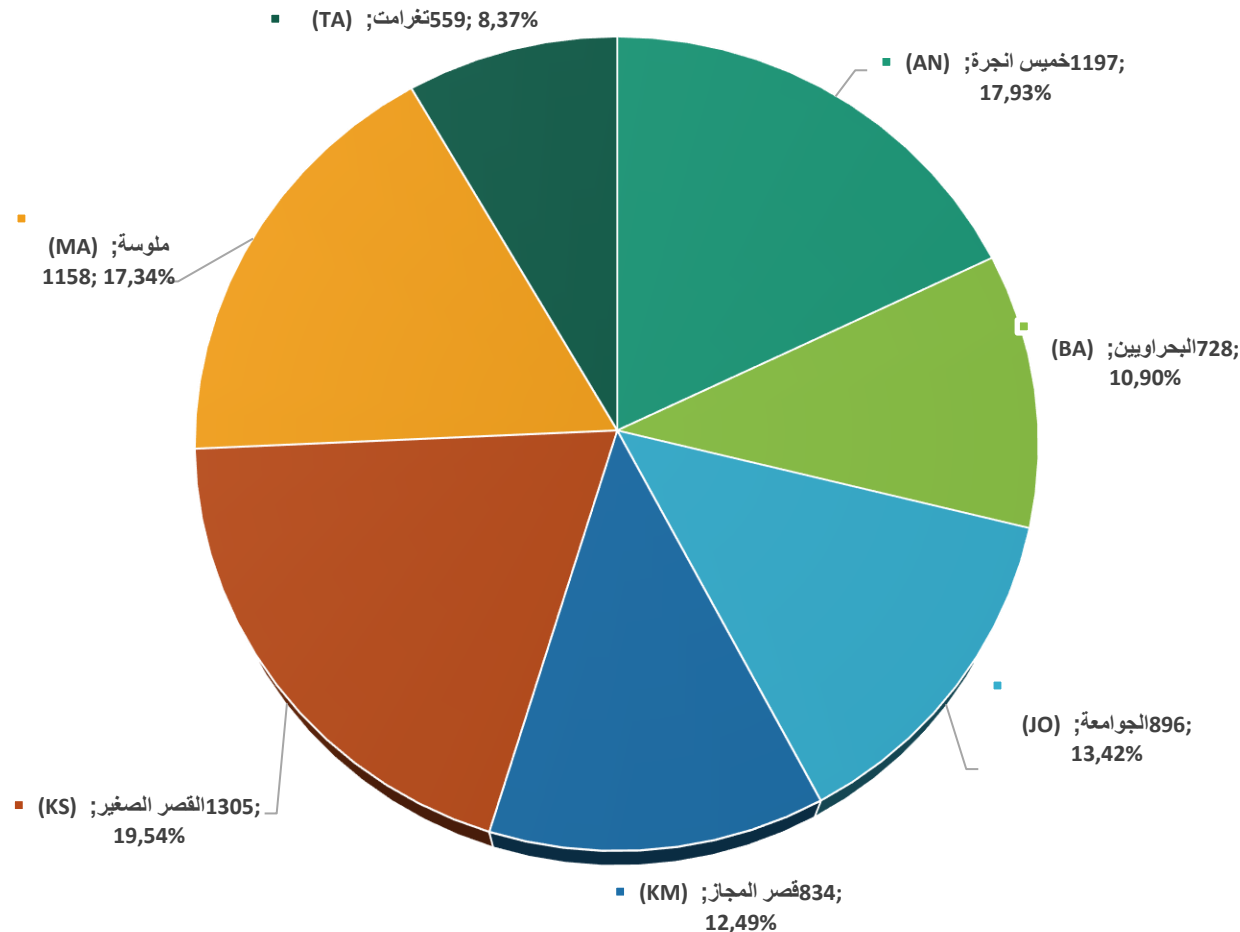

التوزيع حسب المستويات



مجموع  
المستفيدين :  
6677

ثانوي : 2375

اعدادي : 3353


ابتدائي : 949

ذكور : 3292

اناث : 3385

## مجموع حافلات النقل المدرسي إلى حدود شتنبر 2024: 91 حافلة.

سيتم اقتناء 04 حافلات في إطار اتفاقية شراكة بين م.و.ت.ب وشركة النقل المدرسي

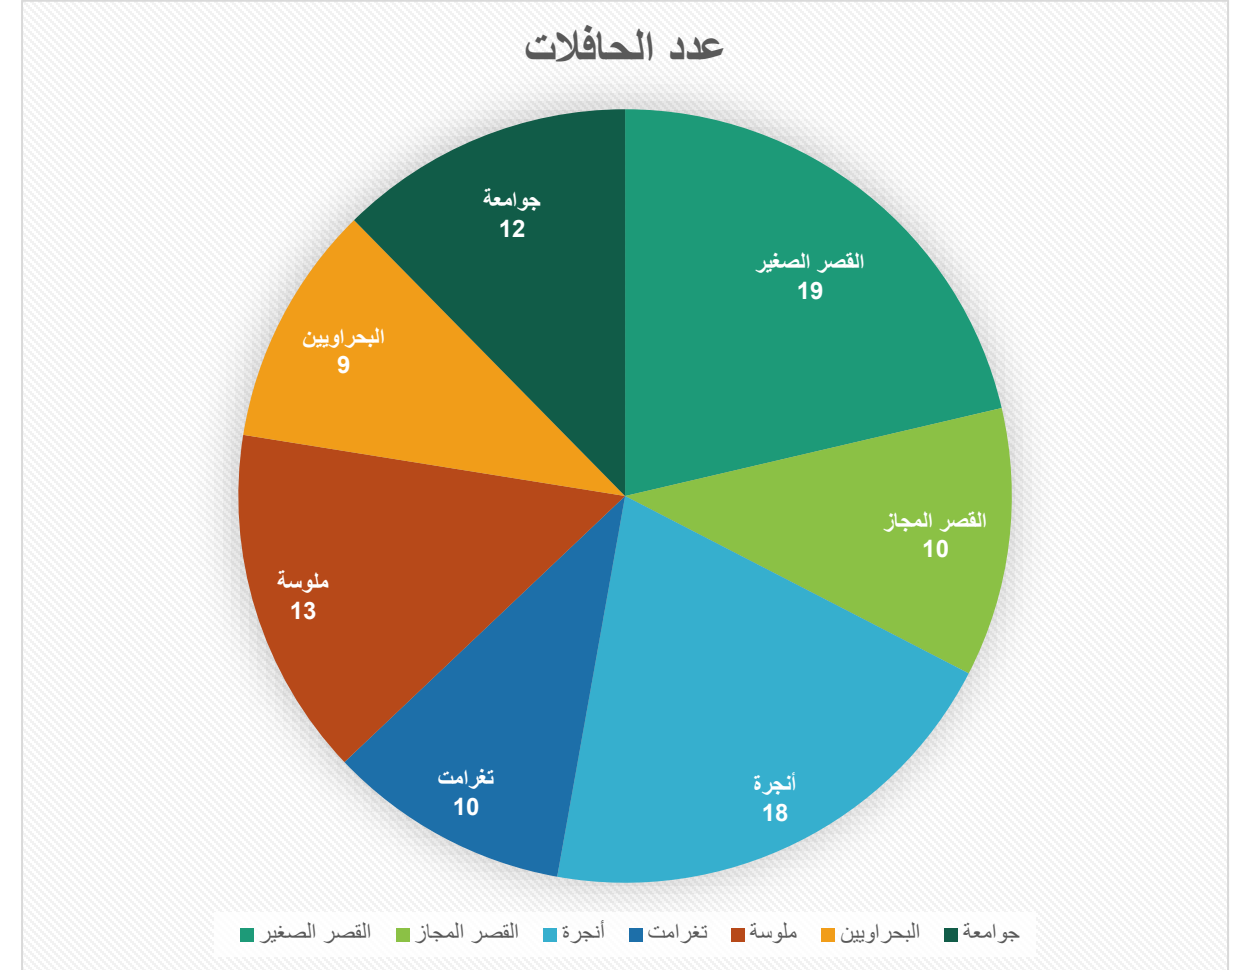


• V-1 تقدم مشاريع النقل المدرسي:

## المؤسسات ونقط الانطلاق

### المؤسسات ونقط الانطلاق

■ ETABLISSEMENT ■ DEPARTS

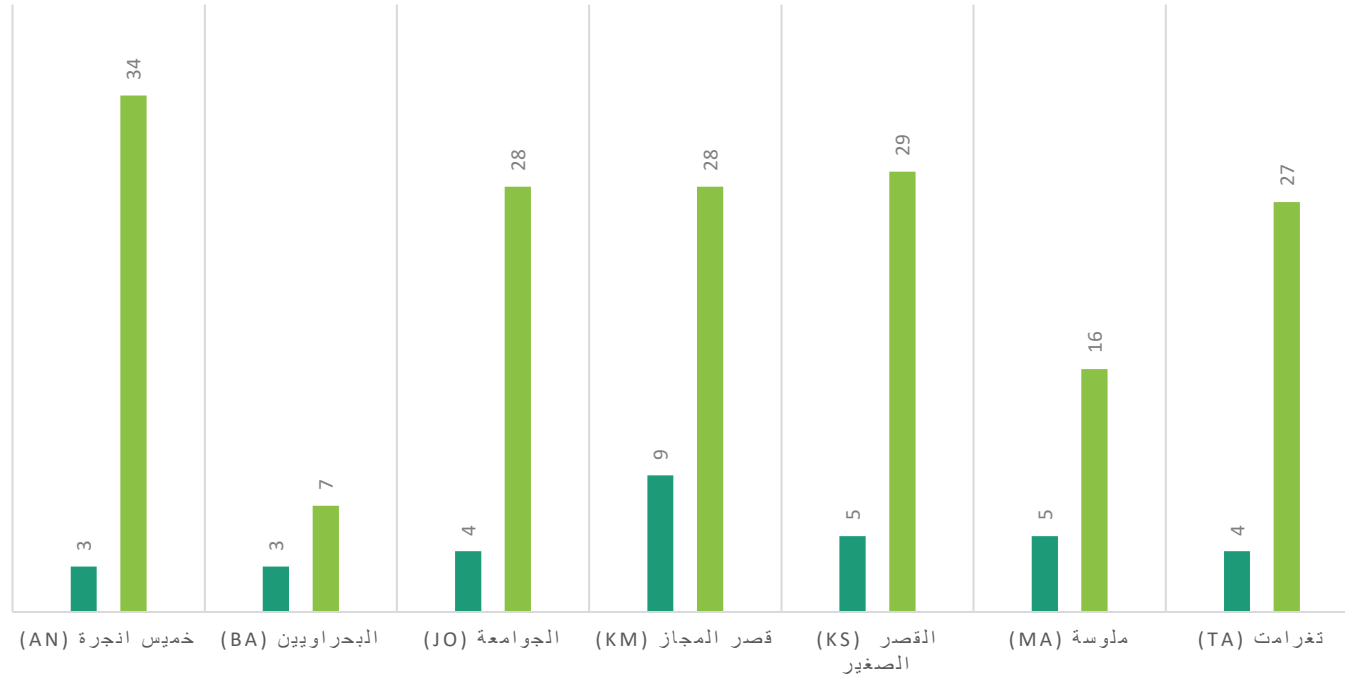

COMMUNE	ETABLISSEMENT	DEPARTS
(AN) خميس انجرة	3	34
(BA) البحر اويين	3	7
(JO) الجوامعة	4	28
(KM) قصر المجاز	9	28
(KS) القصر الصغير	5	29
(MA) ملوسة	5	16
(TA) تغرامت	4	27



• V-1 تقدم مشاريع النقل المدرسي:



• V-2 الطرق والمسالك القروية:

اسم المشروع	توطين المشروع	الكلفة الاجمالية بالدرهم	الشركاء	الكلفة والمساهمة المالية والتزامات الأطراف بالدرهم	تقدم المشروع	
إحداث المسلك المار بمسجد جوامعة	جوامعة	2.200.000,00	ج. جوامعة	1.650.000,00	الأشغال في طور الإنجاز: 40%	
				550.000,00		المجلس الإقليمي
				1.800.000,00		ج. جوامعة
* المسلك المؤدي إلى مدرسة المخالد على طول 0,4 كلم	جوامعة	المسلك مبرمج ضمن (اتفاقية بناء مسلكين بجماعة جوامعة الكلفة الاجمالية للاتفاقية: 2.400.000,00	المجلس الإقليمي	600.000,00	في طور إعداد ملفات طلب العروض	
				1.800.000,00		ج. جوامعة

\* اتفاقية بناء مسلكين:

- مسلك المخالد (0,4 كلم)
- مسلك دارميمون (0,95 كلم)




● مشروع إحداث مسالك بجماعة جوامعة : دوار عيادة



● مشروع إحداث مسالك بجماعة جوامعة : دوار جوامعة



● مشروع إحداث مسالك بجماعة جوامعة : دوار ضهر الوسطي

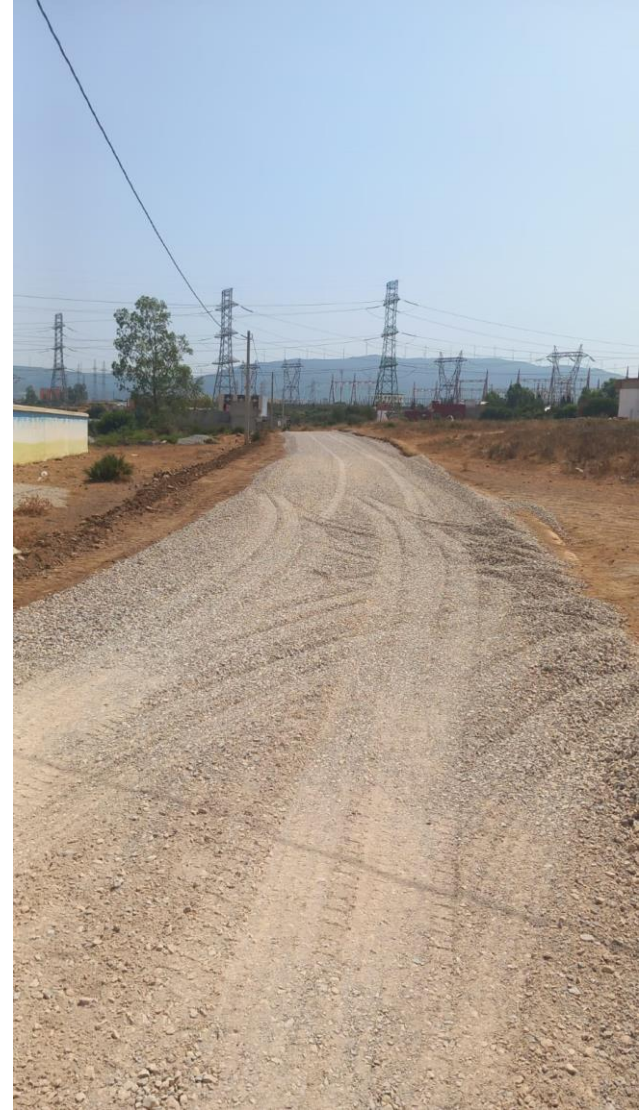

• V-2 الطرق والمسالك القروية:

اسم المشروع	توطين المشروع	الكلفة الاجمالية بالدرهم	الشركاء	الكلفة والمساهمة المالية والتزامات الأطراف بالدرهم	تقدم المشروع
تهيئة المسلك المؤدي إلى مسجد صيوفة 0,3 كلم	جوامعة	3.100.000,00	ج. جوامعة	2.325.000,00	في طور الالتزام المالي لصفقة تتبع ومراقبة الاشغال.
إنجاز مسلك حومة الحاج مفضل بدوار الطيفي 0,28 كلم					
إنجاز مسلك حومة الزيادة بدوار الطيفي 0,3 كلم					
إنجاز مسلك من مسجد دوار المجبحة إلى تنمة الدوار 0,85 كلم			المجلس الإقليمي	775.000,00	
إنجاز المسلك المؤدي إلى مدرسة دوار ظهر البرداع 0,19 كلم					

• 2-V الطرق والمسالك القروية:


اسم المشروع	توطين المشروع	الكلفة الاجمالية بالدرهم	الشركاء	الكلفة والمساهمة المالية والتزامات الأطراف بالدرهم	تقدم المشروع
تنمة أشغال بناء الشطر الثاني من الطريق الرابطة بين الطريق المبلطة والطريق المعبدة بقرية البرج	ملوسة	3.800.000,00	ج. ملوسة	2.200.000,00	صفقة الاشغال في طور المصادقة
بناء الطريق بدوار دار حمران العليا من الطريق الجماعية المعبدة إلى حدود دوار بني واسين					
بناء الطريق الجماعية الرابطة بين الطريق المبلطة إلى عمراناش السفلى بقرية الزميح . الشطر الأول			المجلس الإقليمي	1.600.000,00	

اسم المشروع	توطين المشروع	الكلفة الاجمالية بالدرهم	الشركاء	الكلفة والمساهمة المالية والتزامات الأطراف بالدرهم	تقدم المشروع		
تقوية وصيانة مسلك دوار ازراوع ونقط الانجراف حوالي 820 متر	القصر الصغير	1.343.523,76	المجلس الإقليمي	1.343.523,76	تم انتهاء الأشغال التسليم المؤقت في 14 يونيو 2024		
صيانة مسلك دوار مليش حوالي 60 متر							
بناء وتهيئة مسلك بين الطريق الوطنية 16 ودوار حسانة على طول 500 متر					المجلس الإقليمي	3.000.000,00	المشاريع في طور الدراسة التقنية
بناء وتهيئة مسلك بالتجمع السكني التويتة على طول 400 متر							
بناء وتهيئة مسلك بداخل دوار الزهارة على مسافة 500 متر							

\* اتفاقية بناء خمس مسالك:

- مسلك حسانة (0,5 كلم)
- مسلك التويتة ( 0,4 كلم)
- مسلك الزهارة (0,5 كلم)
- 30مسلكين بالقصر الصغير ( 1,0 كلم)

● الطرق والمسالك القروية: مسلك مليش (بداية الأشغال)

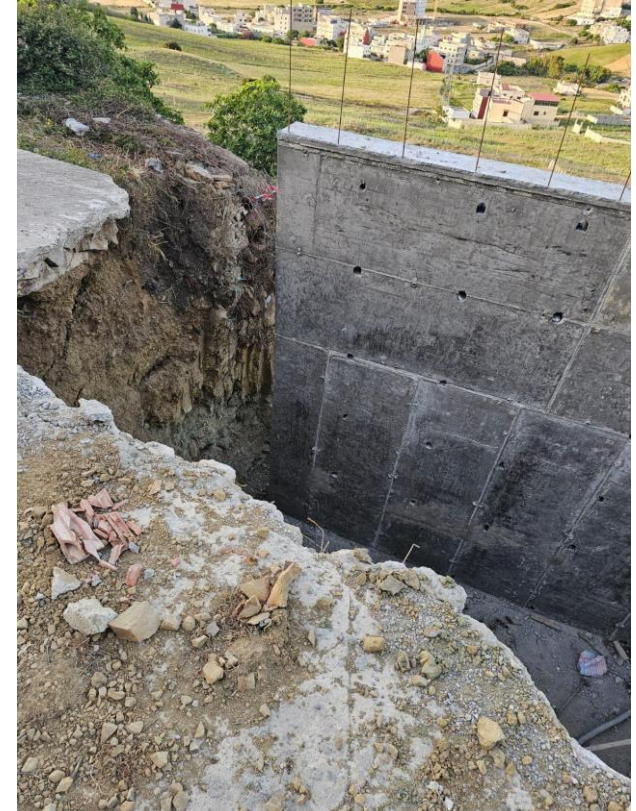

• الطرق والمسالك القروية: مسلك ملييش (بعد الأشغال)





● الطرق والمسالك القروية: مسلك الزراع (بداية الأشغال)



• الطرق والمسالك القروية: مسلك الزراع (نهاية الأشغال)



• V-2 الطرق والمسالك القروية:

اسم المشروع	توطين المشروع	الكلفة الاجمالية بالدرهم	الشركاء	الكلفة والمساهمة المالية والتزامات الأطراف بالدرهم	تقدم المشروع
بناء مسلك بفدان شابو العليا على مسافة 820 متر طولي	البحراويين	3.700.000,00	ج. البحراويين	2.500.000,00	في طور الالتزام المالي لصفقة الاشغال.
				بناء مسلك بفدان شابو السفلى على مسافة 560 متر طولي	
				بناء مسلك بدوار المنار الغربية بطول 550 متر طولي	
بناء مسلك النوينويش الغربية على طول 560 متر بجماعة البحراويين		1.200.000,00	ج. البحراويين	1.200.000,00	- المشروع في طور الدراسة التقنية
				المجلس الإقليمي	
			المجلس الإقليمي	400.000,00	

اسم المشروع	توطين المشروع	الكلفة الاجمالية بالدرهم	الشركاء	الكلفة والمساهمة المالية والتزامات الأطراف بالدرهم	تقدم المشروع
بناء الطريق الرابطة بين مركز أنجرة ودوار أزير على طول 1,2 كلم بجماعة أنجرة	أنجرة	1.560.000,00	ج. أنجرة	390.000,00	في طور إعداد ملفات طلب العروض
			المجلس الإقليمي	1.170.000,00	
		2.600.000,00	ج. أنجرة	650.000,00	
			المجلس الإقليمي	1.950.000,00	
بناء وتهيئة الطريق بين مسجد الحامة ومركز مدشر الحامة 1 كلم	قصر المجاز	7.500.000,00	ج. قصر المجاز	6.000.000,00	في طور استكمال أشغال فتح أطرفه الصفقة التي تم عقدها بتاريخ 26 شتنبر 2024. الجلسة الثانية بتاريخ 08 أكتوبر 2024
بناء الطريق بدوار عين حجيرة على مسافة 1.5 كلم					
تهيئة طريق من مدخل الطريق الوطنية رقم 16 إلى مدرسة لوطا عين الشوكة مع تهيئة بعض المقاطع الطرقية بدوار لوطا عين الشوكة 2 كلم	المجلس الإقليمي	1.500.000,00			في طور استكمال أشغال فتح أطرفه الصفقة التي تم عقدها بتاريخ 03 أكتوبر 2024

• الطرق والمسالك القروية:

اسم المشروع	توطين المشروع	الكلفة الاجمالية بالدرهم	الشركاء	الكلفة والمساهمة المالية والتزامات الأطراف بالدرهم	تقدم المشروع
* صيانة المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية 4703 ومسجد المغاربة 1,4 كلم	تغرامت	المسلك مبرمج ضمن) اتفاقية صيانة أربع مسالك بجماعة (تغرامت) الكلفة الاجمالية للاتفاقية: 5.900.000,00	ج. تغرامت	5.900.000,00	تقدم المشروع
			المجلس الإقليمي	الدراسة التقنية والتتبع	في طور إعداد اتفاقية الشراكة


- \* اتفاقية صيانة أربع مسالك:
- مسلك المغاربة (1,4 كلم)
  - مسلك البيوت (0,74 كلم)
  - مسلك واد المرسي (1,72 كلم)
  - مسلك هوادراش (0,83 كلم)

# ٧. تقدم المشاريع

• طول المسالك القروية المعتمدة حسب الجماعات إلى غاية شتنبر 2024:

الجماعة	ملوسة	انجرة	القصر الصغير	قصر المجاز	البحراويين	جوامعة
الطول ب كلم	2	3,2	2,3	4,5	2,5	3,5

طول المسالك بكلم

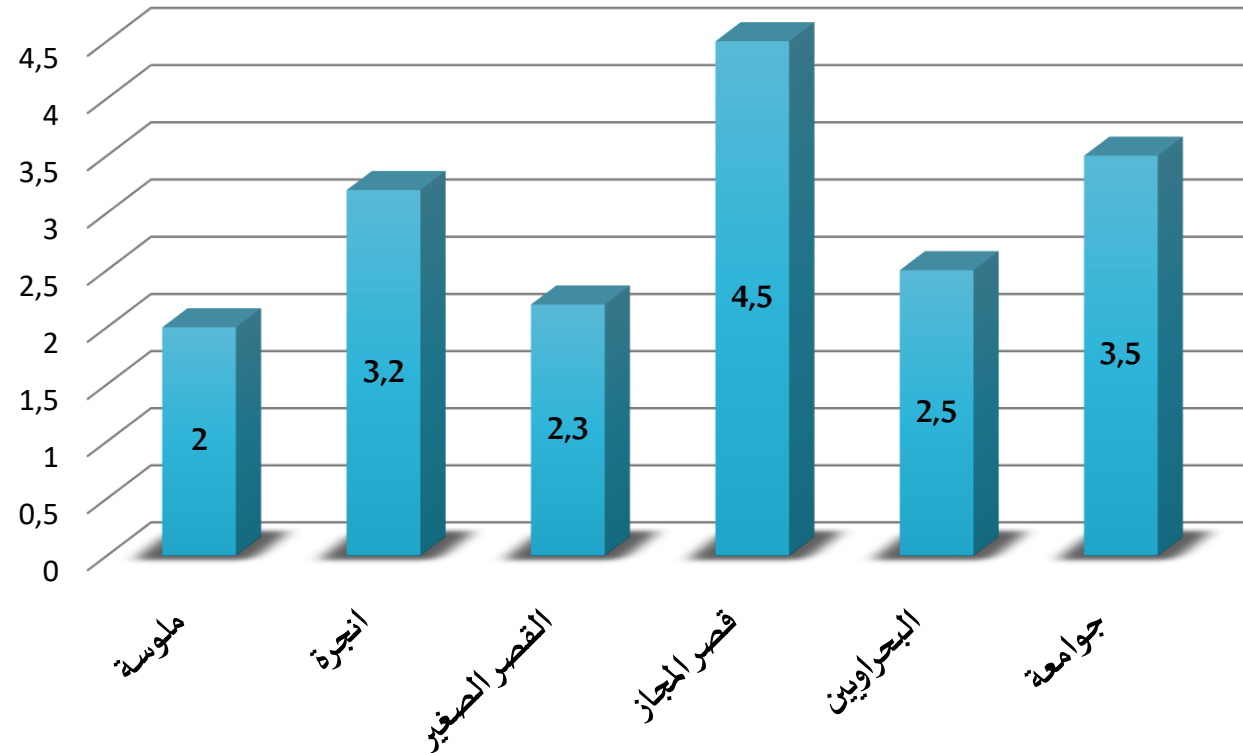


## ٧. تقدم المشاريع

- الكلفة الإجمالية المعتمدة لإنجاز مشاريع المسالك القروية حسب الجماعات إلى غاية شتنبر 2024:

جماعة	ملوسة	انجرة	القصر الصغير	قصر المجاز	البحراويين	جوامعة
الكلفة الإجمالية ب م.د	3,80	4,16	5,84	7,50	4,90	7,70

الكلفة الإجمالية ب م.د

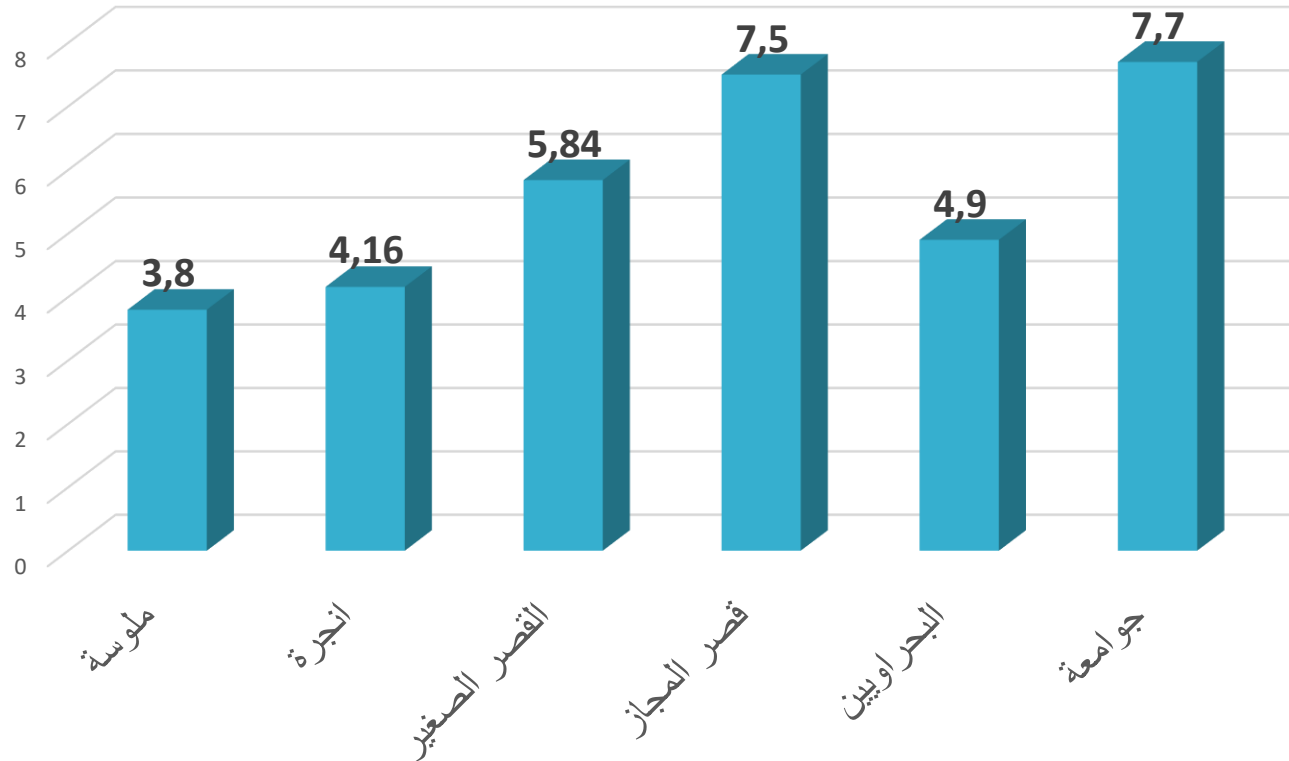

## ٧. تقدم المشاريع

### • ٧-3 الكهربية القروية:

اسم المشروع	توطين المشروع	الكلفة الاجمالية بالدرهم	الشركاء	الكلفة والمساهمة المالية والتزامات الأطراف بالدرهم	تقدم المشروع
أشغال الكهربية القروية ببعض الدواوير التابعة لجماعة جوامعة	جوامعة	1.500.000,00	ج. جوامعة	644.183,90	الأشغال في طور الإنجاز: 30%
			المجلس الإقليمي	855.816,10	



## ٧. تقدم المشاريع

- المشاريع الملغاة التي كان مقررا تنفيذها في السنتين الأولتين من البرنامج، تنحصر في ثلاث مشاريع في قطاع التعليم لتفادي تكرارها، بسبب إنجازها من طرف القطاع الوصي، والتي تبلغ كلفتها التقديرية **2.3 مليون درهم**.
- عدد المشاريع المدرجة في برنامج التنمية خلال سنوات 2023 و2024 والتي لم يتم تنفيذها تصل إلى **12 مشروعا**.

## ٧. تقدم المشاريع


بذلك يكون العدد الإجمالي للمشاريع المنفذة أو التي في طور التنفيذ، أو المبرمجة بمعنى تم تعبئة الاعتمادات الخاصة بها، إلى غاية شهر شتنبر 2024: **35مشروعاً**، بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى **52,89 مليون درهم**.

المجالات	الكلفة التقديرية ب م,د
النقل المدرسي	17,49
الكهربة القروية	1,50
المسالك القروية	33,90
<b>المجموع</b>	<b>52,89</b>

## ٧١. مؤشرات التأثير الإيجابي للمشاريع على الساكنة

- العدد التقديري للساكنة المستفيدة من مشاريع الطرق والمسالك القروية:

الجماعة	ملوسة	انجرة	القصر الصغير	قصر المجاز	البحراويين	جوامعة
عدد الساكنة (الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014)	12250	16081	12997	10237	8465	7711
* العدد التقديري للساكنة المستفيدة	1827	5290	4026	1450	3062	3040

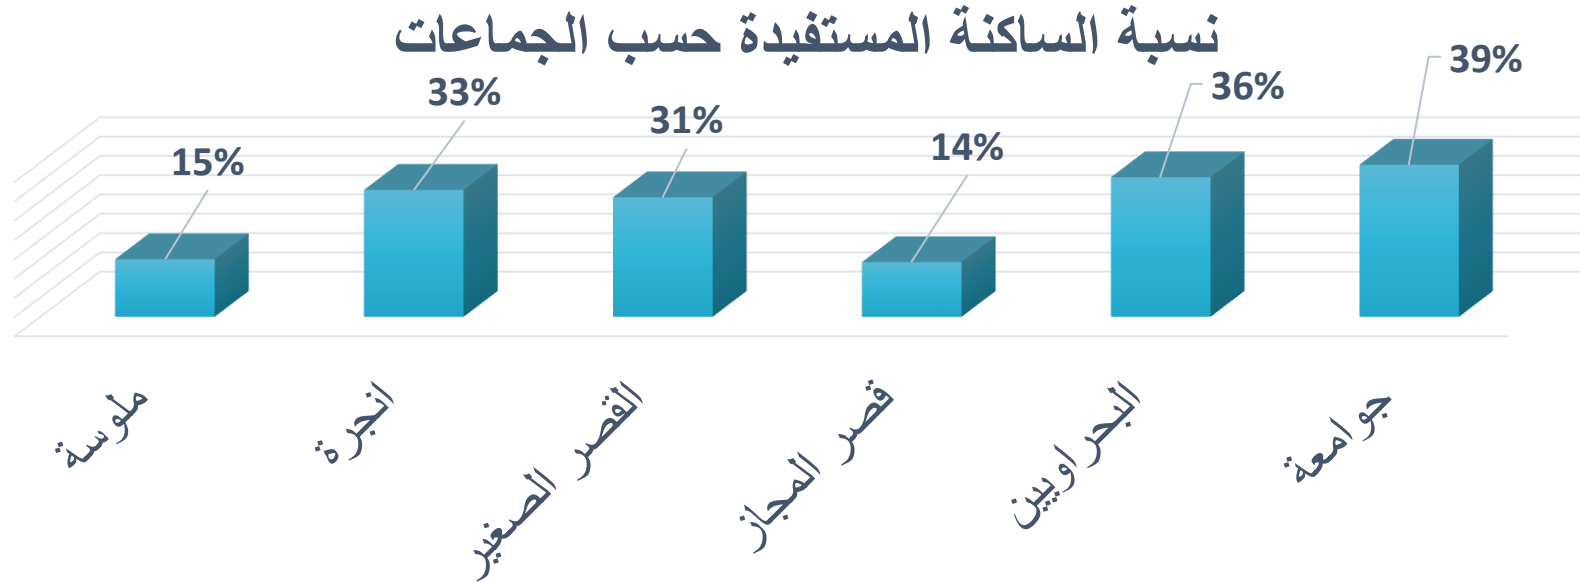


\* مصدر المعطيات التقديرية: جماعات الإقليم المعنية بالمشاريع

## ٧١. مؤشرات التأثير الإيجابي للمشاريع على الساكنة

• اعداد التلاميذ المستفيدين من النقل المدرسي :

تغرامت	جوامعة	البحراويين	قصر المجاز	القصر الصغير	انجرة	ملوسة	الجماعة
1912	2709	3467	1849	3975	3976	4096	عدد التلاميذ المتمدرسين (قاعدة بيانات المديرية الإقليمية فحص انجرة غشت 24)
559	896	728	834	1305	1197	1158	* عدد المسجلين في النقل المدرسي (30 شتنبر 24)

نسبة المستفيدين من النقل المدرسي من مجموع المتمدرسين حسب الجماعات

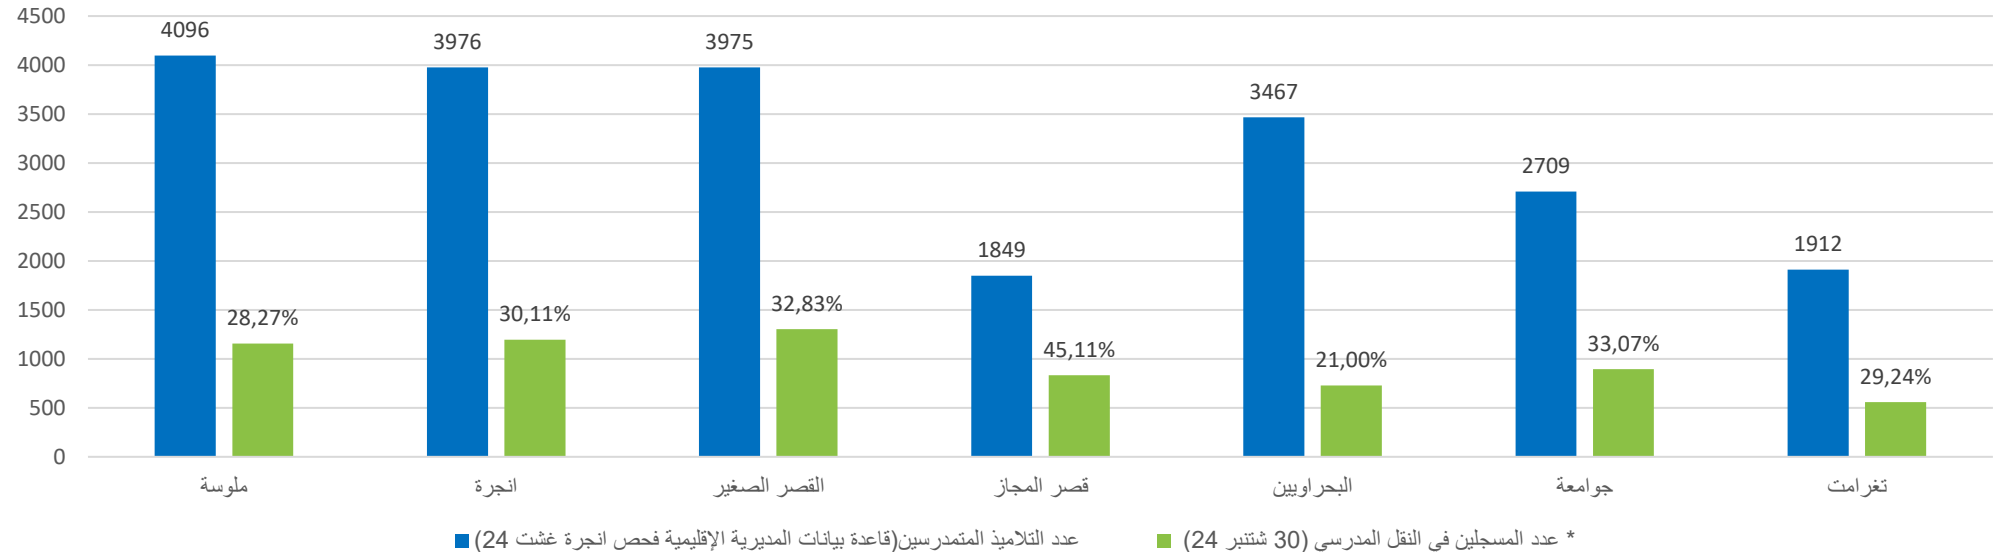

## VIII. الإكراهات وصعوبات التنفيذ

- من الإكراهات التي يمكن تسجيلها بخصوص تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج تنمية الإقليم، ما يلي:
  - ضعف الموارد المالية للمجلس الإقليمي وأيضاً لأغلب الجماعات التابعة للإقليم، مما يحد من إمكانية الشراكة بين المجلس وهذه الجماعات، وتعبئة المبالغ المالية الخاصة ببناء وتهيئة الطرق والمسالك.
  - تعتمد الميزانية الإقليمية بشكل شبه كلي في تمويل المشاريع على إمدادات الدولة من الضريبة على القيمة المضافة، فوائض ميزانية التسيير المتأتية من ترشيد النفقات ومن الاعتماد بالأساس على حصة الإقليم من منتج الضريبة على القيمة المضافة التي عرفت تراجعاً خلال السنوات الأخيرة، الشيء الذي من شأنه أن يقلص من قدرة المجلس على برمجة اعتمادات في ميزانية التجهيز لتمويل برامج التنمية.

- هذه باختصار أهم المعطيات المتعلقة بالعمل المشترك الذي بذل إلى غاية شهر شتنبر 2024 من طرف جميع الفاعلين لتنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج تنمية إقليم الفحص-أنجرة 2023-2028،
- وأيضا المشاريع المتبقية التي نأمل أن يتم التعاون من أجل تعبئة الموارد الخاصة بها لبرمجتها وتنفيذها داخل الفترة المحددة للبرنامج.

شكرا على انتباهكم
